



Основные понятия управления проектом

Всё это проекты?

- ❖ Пирамиды в Египте
- ❖ Вакцина от гриппа
- ❖ Издательство книги для детей
- ❖ Разработка ПО
- ❖ Разработка ракеты SpaceX
- ❖ Дизайн квартиры



PMBOK:

A **Project** is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result.

There's a definite beginning and end.

Generally the end is reached when project objectives have been met.

- ❖ *Unique product, service or result*
- ❖ *Temporary endeavor*
- ❖ *Projects drive change*



Цель проекта - конечный **результат**, на который направлены все работы



уникальный продукт



уникальная услуга



уникальный результат




уникальное сочетание

Проект - временное предприятие



Process VS Project

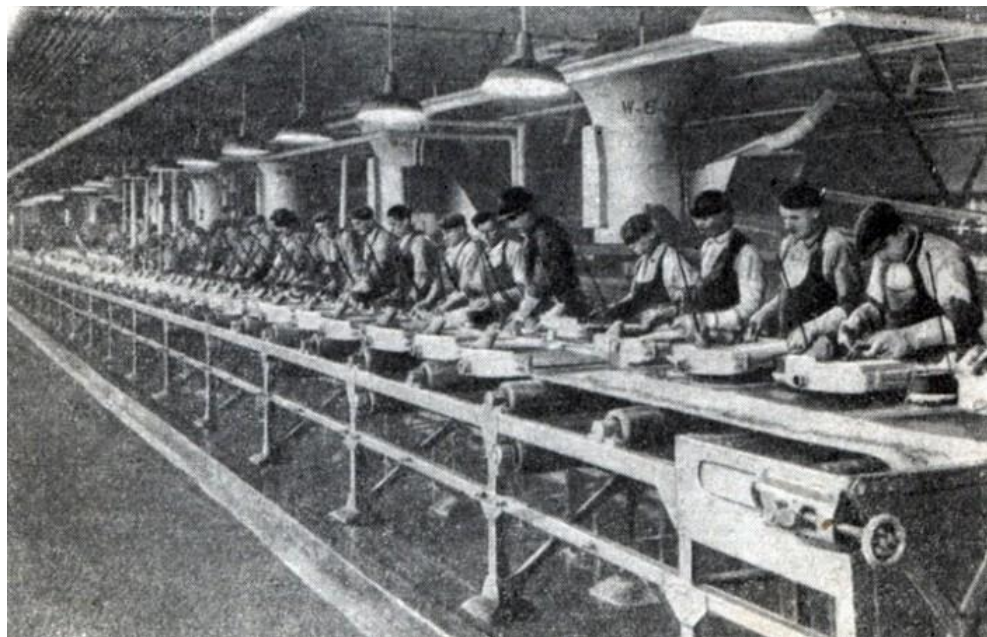


- ❖ Time: pace
- ❖ Repetitive actions.




- ❖ Time: deadline, start, finish
- ❖ Unique product


Проектный треугольник

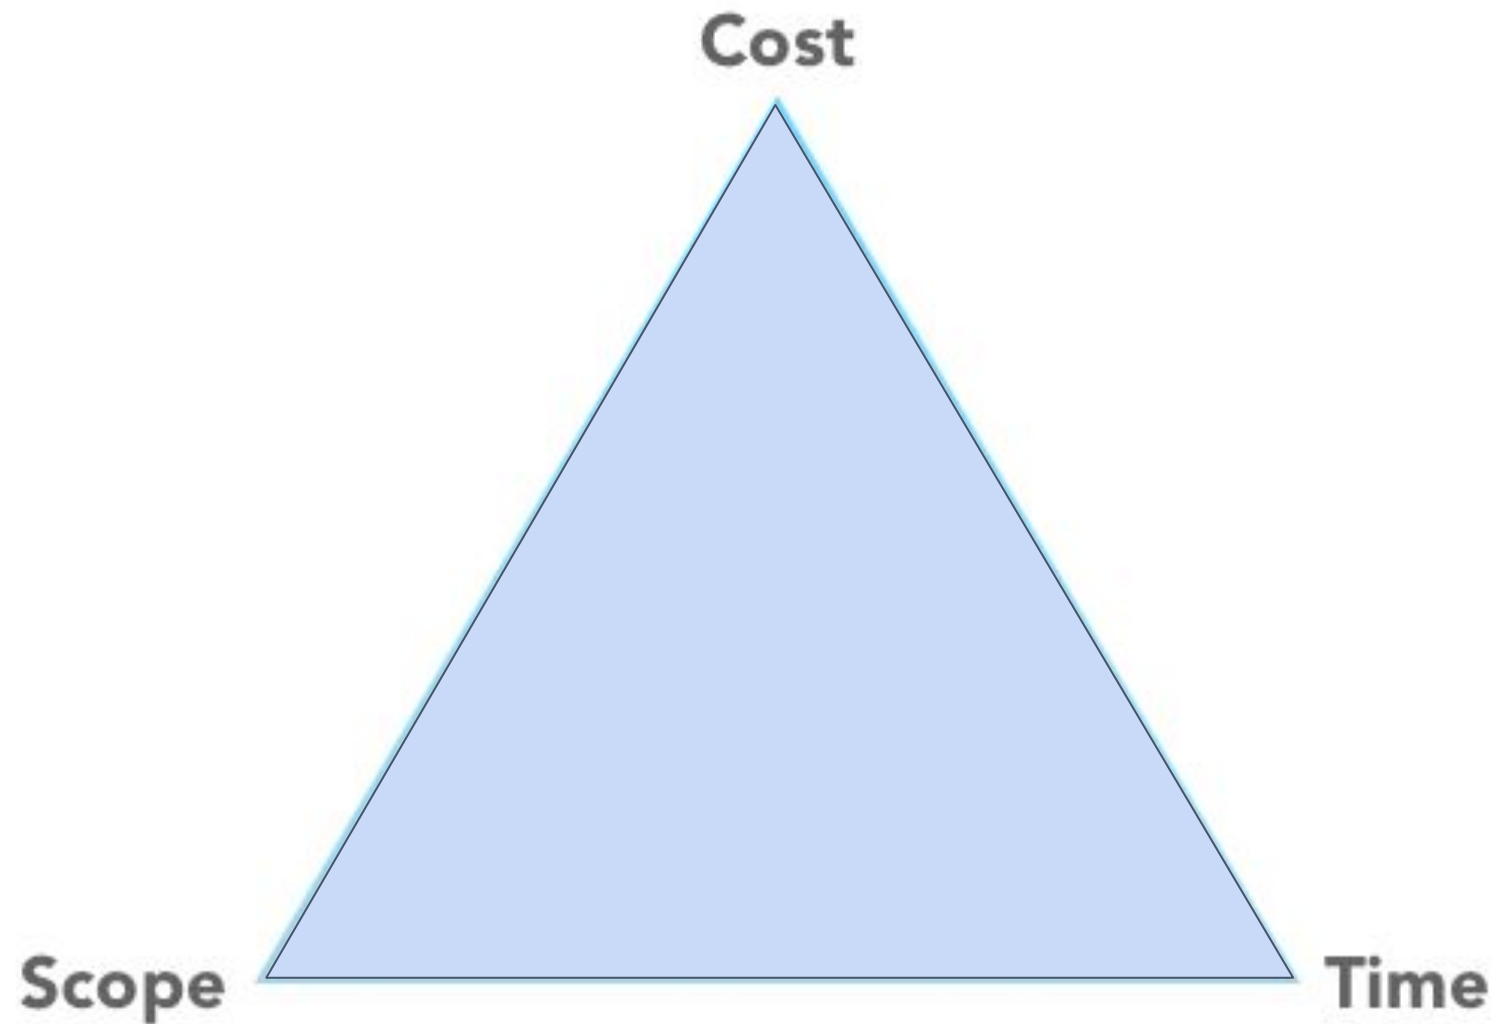

Проектный треугольник

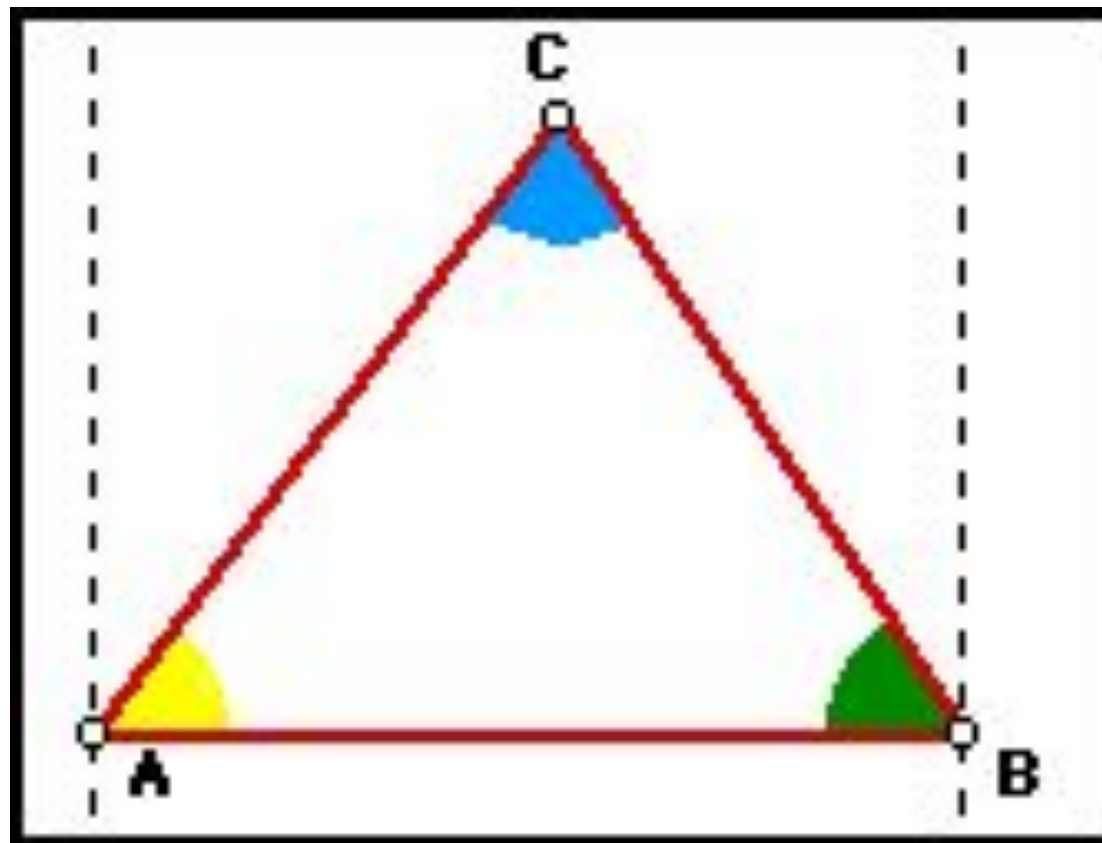

Проектный треугольник

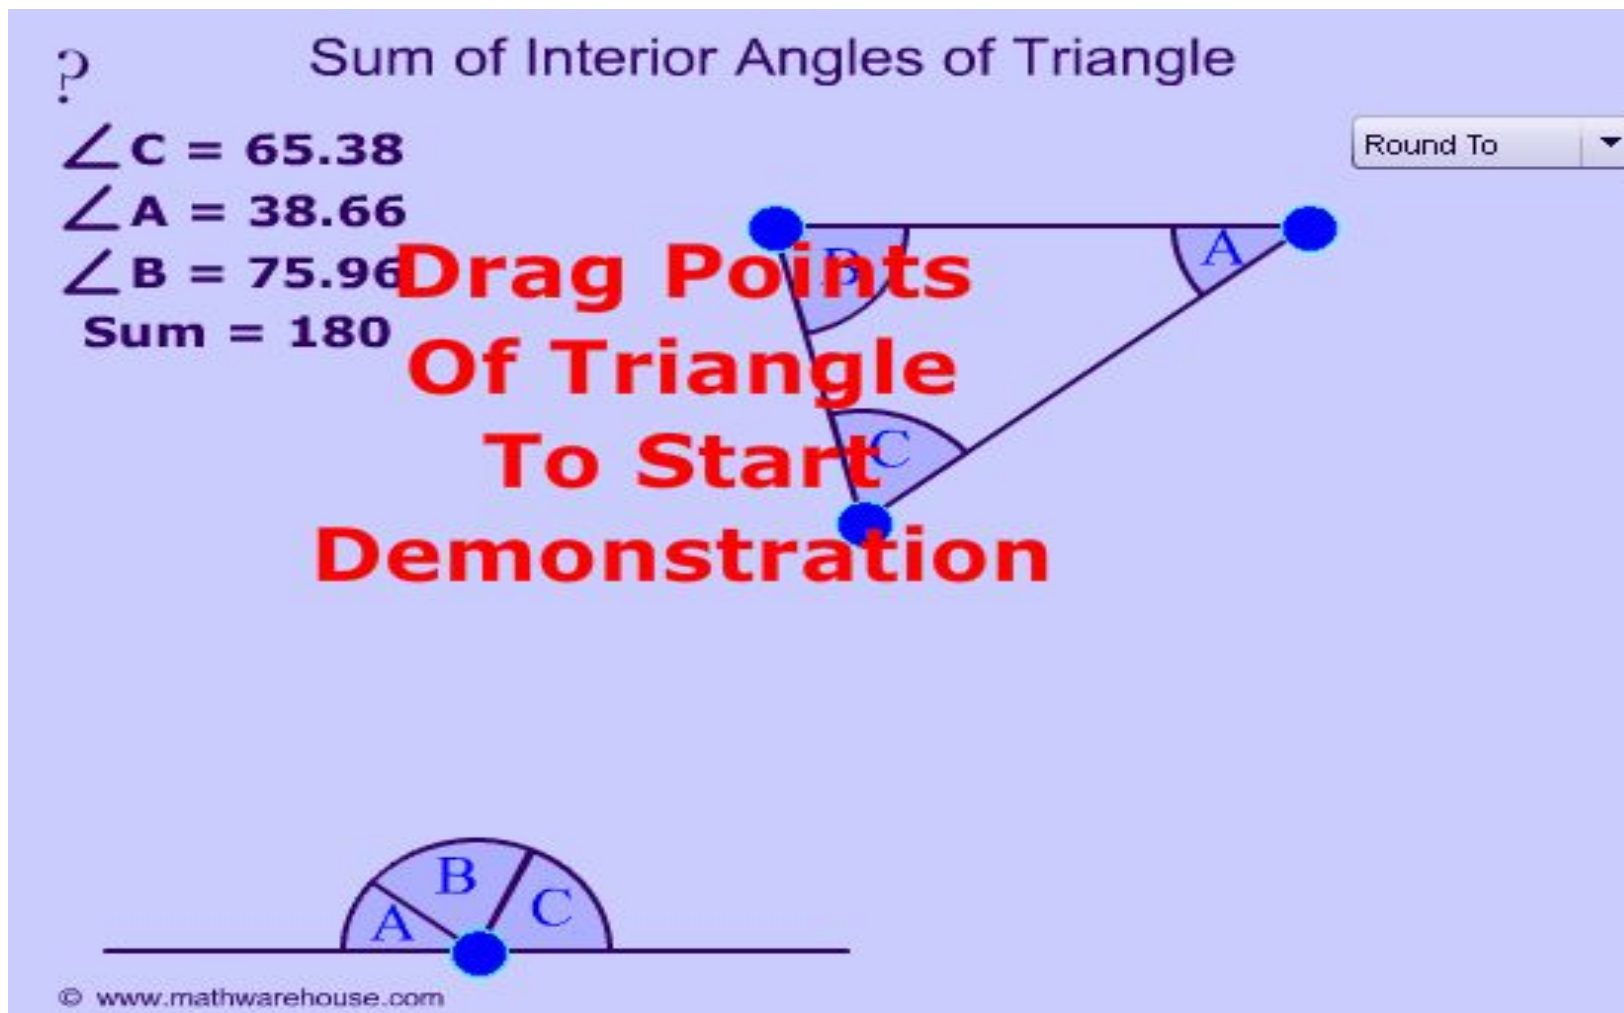

Ограничения проекта



Проектный треугольник



SCOPE

Содержание проекта

- ❖ Что нужно сделать, чтобы получить продукт/результат/услугу?
- ❖ “Содержание проекта” = “содержание продукта”?




TIME & DURATION

Время/длительность проекта


Start Date и Finish Date могут быть:

- ❖ actual
- ❖ planned
- ❖ estimated
- ❖ scheduled
- ❖ early
- ❖ late
- ❖ target
- ❖ baseline
- ❖ current

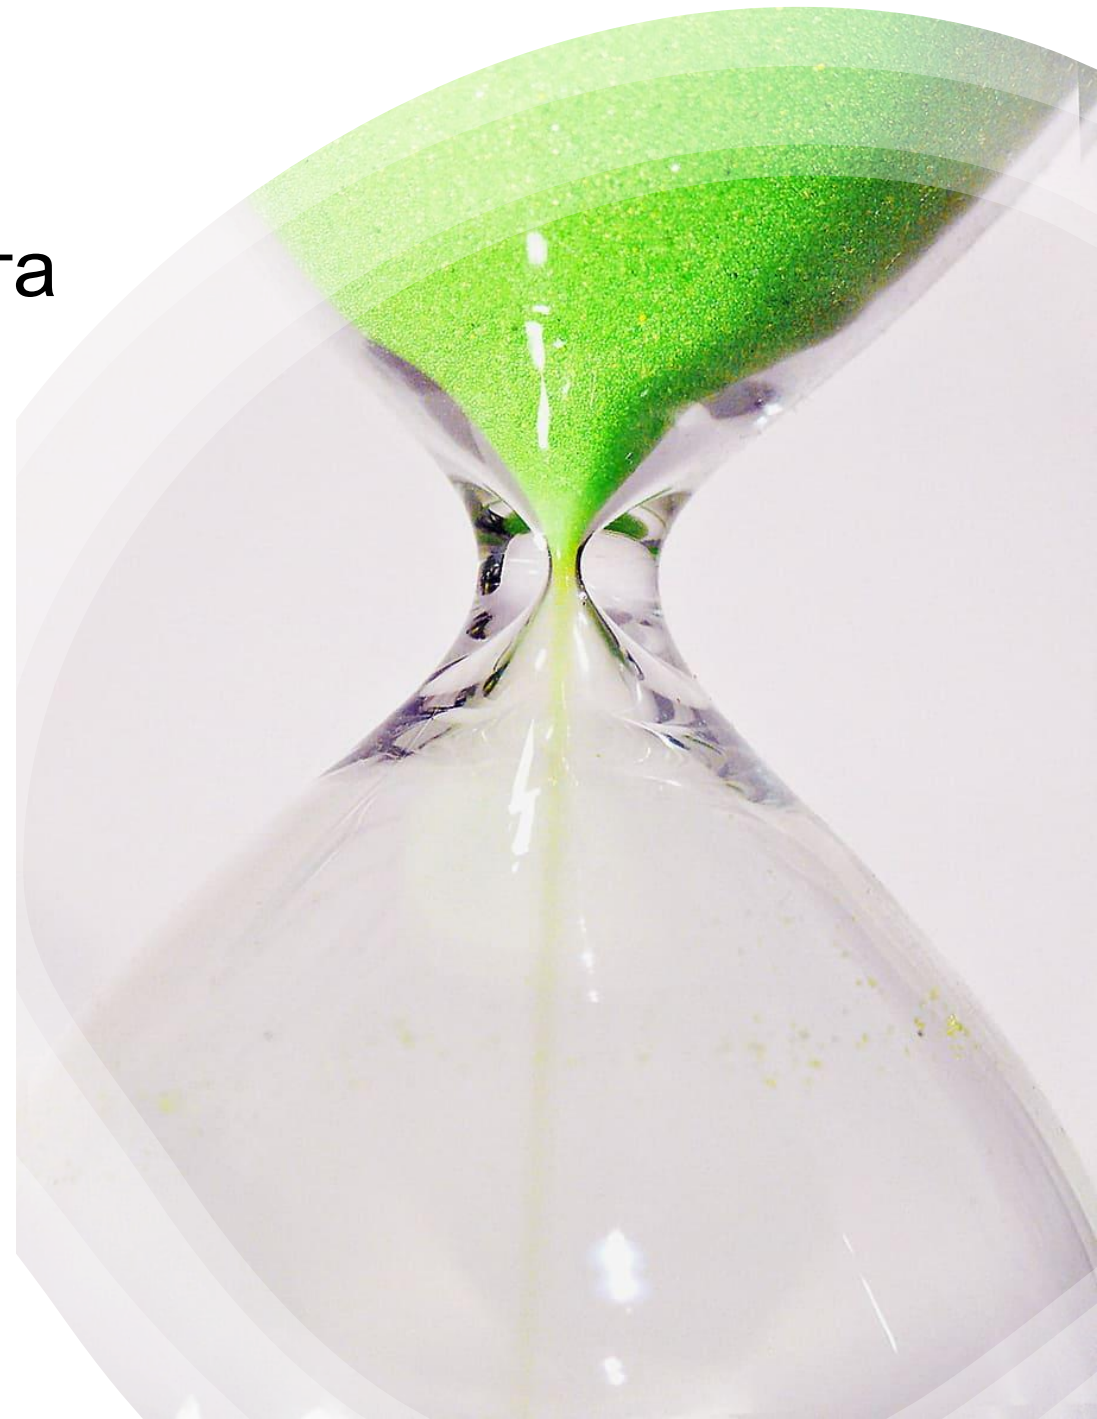

ESTIMATE

в чём оценивать?

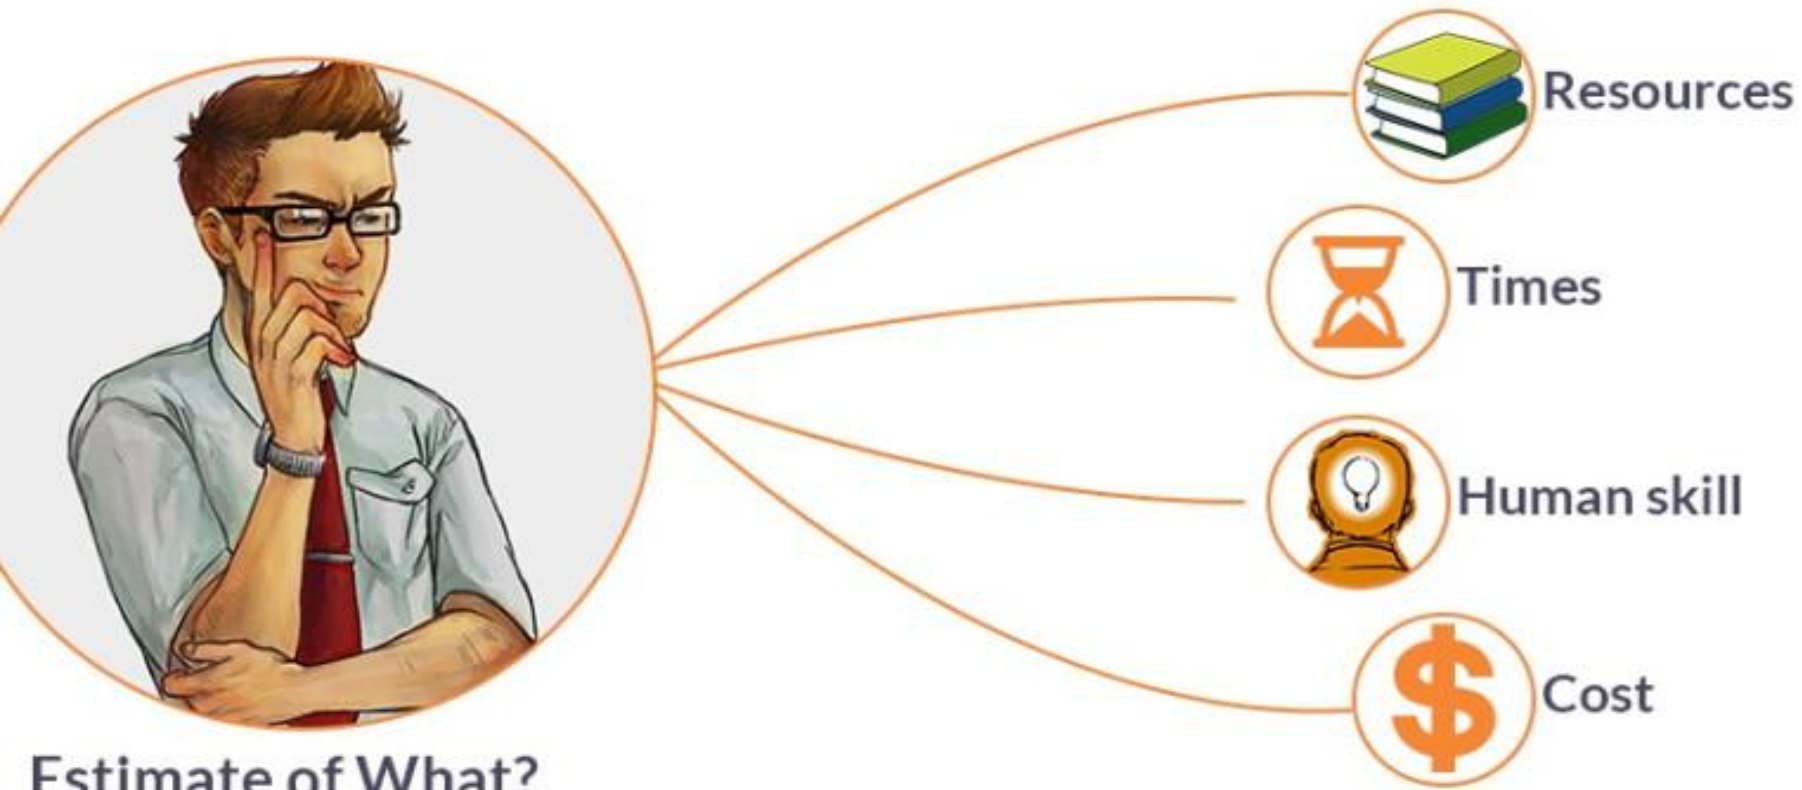

STAKEHOLDERS


Заинтересованные лица

- ❖ влияет в проект
- ❖ может повлиять на проект
- ❖ на кого проект может повлиять





Что значит
‘Управлять
проектом’?



01

Управление проектом — это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для *удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.*

02

Управление проектом осуществляется посредством надлежащего применения и интеграции *процессов управления проектом, установленных для данного проекта.*

03

Управление проектом дает организациям возможность исполнять проекты *результативно и эффективно.*



Руководитель проекта и команда



Дирижер и оркестр



Состав и роли




Состав и роли

- В составе участников большого проекта и оркестра имеется много членов, каждый из которых играет свою особую роль. В большом оркестре под управлением дирижера может играть более 100 музыкантов.
- Эти музыканты могут использовать 25 разных типов инструментов, разбитых на основные группы, такие как струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты.
- Таким же образом, в работе над крупным проектом под управлением руководителя проекта может находиться более 100 участников проекта.
- Члены команды проекта могут выполнять разные функции, такие как проектирование, изготовление и управление средствами производства. Как и основные группы оркестра, они представляют различные бизнес-подразделения или группы в организации.
- Музыканты и члены проекта составляют команду каждого из руководителей.

Ответственность команды

- Как руководитель проекта, так и дирижер несут ответственность за произведенный их командой продукт — конечный результат проекта или концерт оркестра

Знания и навыки

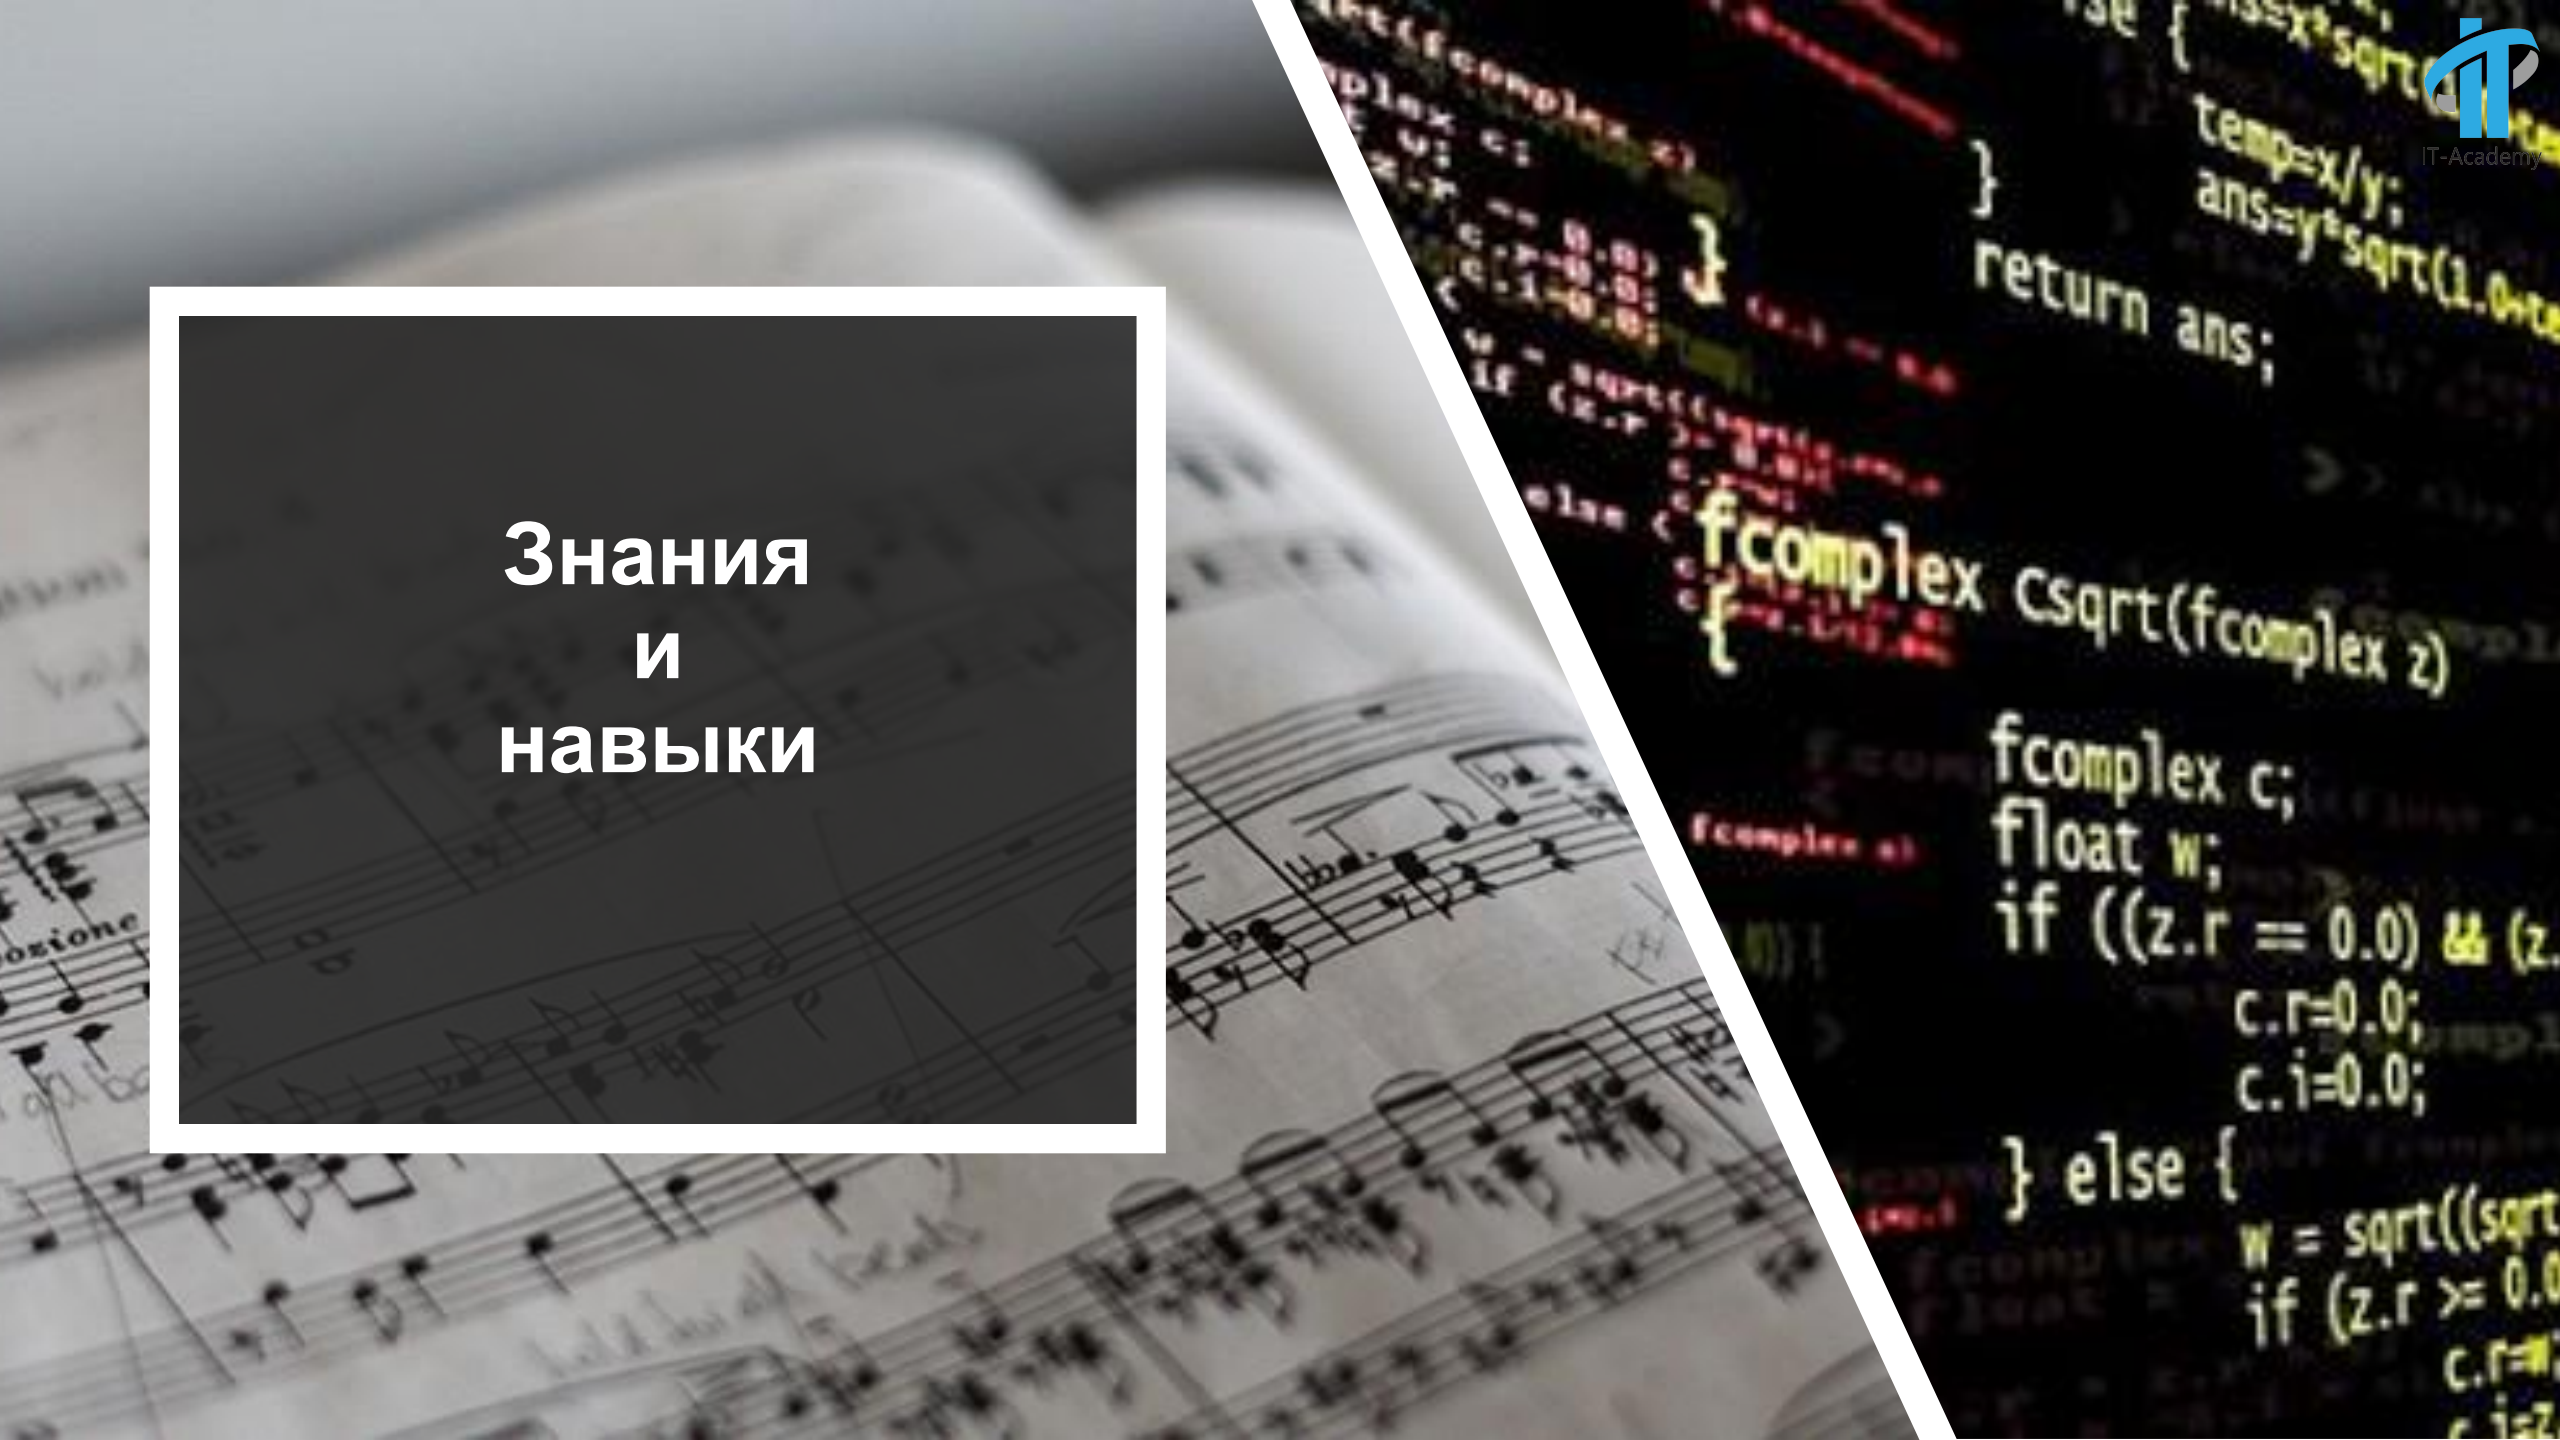

Знания и навыки

- Дирижер не должен уметь играть на всех инструментах в оркестре, но должен обладать знанием и пониманием музыки и опытом в этой области.
- Дирижер обеспечивает управление оркестром, планирование и координацию с помощью коммуникации.
- Дирижер обеспечивает письменные коммуникации в форме нот и расписаний репетиций.
- Дирижер также осуществляет коммуникации с оркестром в реальном времени с помощью дирижерской палочки и различных движений тела.
- Руководитель проекта не должен исполнять все роли в проекте, но должен обладать знаниями по управлению проектом, техническими знаниями, пониманием и опытом в этой области.
- Руководитель проекта обеспечивает управление командой проекта, планирование и координацию с помощью коммуникаций.
- Руководитель проекта осуществляет письменные коммуникации (например, готовит документированные планы и расписания) и коммуникации с командой в реальном времени с помощью проведения совещаний, а также вербальных или невербальных условных сигналов.

Менеджер – человек, который
работает с людьми

Работа с людьми основана на психологии людей.
От этого никуда не деться, и это надо изучать.



Примеры проектов:

- ❖ разработка новых фармацевтических препаратов для рынка
- ❖ расширение экскурсионных туристических услуг
- ❖ слияние двух организаций
- ❖ совершенствование бизнес-процесса в организации
- ❖ разведка нефтяных месторождений в регионе
- ❖ разработка или модификация компьютерной программы
- ❖ строительство здания



Что из этого проект?

- ❖ организация вечеринки
- ❖ внедрение новой процедуры подбора персонала компании
- ❖ уборка квартиры
- ❖ замена информационной системы по учету труда и заработной платы компании
- ❖ ремонт моста на Немиге
- ❖ снос монумента на площади
- ❖ выплата зарплаты на предприятии
- ❖ организация Олимпиады
- ❖ постройка типового дома в микрорайоне
- ❖ апгрейд планшета производителем
- ❖ разработка и вывод на рынок приложения **FLO**
- ❖ составление ежегодных финансовых отчётов предприятия
- ❖ покупка **Twitter**
- ❖ строительство Титаника

Проект: “Курс Управление проектами в IT”

- ❖ название и краткое описание (суть) проекта
- ❖ содержание проекта (scope)
- ❖ предполагаемые временные рамки (duration, start date, finish date)
- ❖ предполагаемая стоимость (cost)
- ❖ заинтересованные лица (stakeholders)

Зачем проектом управлять?

Что значит,
управлять
'плохо'?

Что сделать дома

- почитать 1 главу PMBok
- описать свой проект по основным понятиям РМ (см. домашнее задание)
- bonus: почитать Agile manifest и Scrum guide
